



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO										PERÍODO DESTA MEDIÇÃO				EMPRESA CONTRATADA: CRIMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA						N°		PREFEITURA DE FERVEDOURG POR UM MUNICÍPIO QUE SE PROTEGE			
OBJETO:PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE CONCRETO - TRECHO ZONA RURAL - (MORRO GRANDE) - FERVEDOURO - MG										20/06/2026 À 14/08/2026				CNPJ: 28.763.303/0001-85						03					
LOCAL: FERVEDOURO/MG										FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA															
DATA BASE DO ORÇAMENTO: AGO/2025 NÃO DESONERADA										BDI 1 = 20,73%				BOLETIM DE MEDIÇÃO											
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS										CC 003/2025 CONTRATO: 372/2025										BDI 2 =					
ORÇAMENTO										EXECUTADO ACUMULADO ATÉ ESTE BM				EXECUTADO NO PERÍODO				EXECUTADO ACUMULADO INCLUSIVE ESTE BM				SERVIÇOS A EXECUTAR			
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNIT. S/BDI+DESC.	PREÇO UNIT. C/BDI	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL C/ LDI	%	QUANTIDADE	TOTAL (R\$)	%	QUANTIDADE	TOTAL (R\$)	%	QUANTIDADE	TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	TOTAL (R\$)						
1			PAVIMENTAÇÃO TRECHO RURAL - MORRO GRANDE					R\$ 289.818,38																	
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.321,64																	
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	M²	R\$ 380,95	R\$ 459,92	4,50	R\$ 2.069,64	100%	4,50	R\$ 2.069,64					100,00%	4,50	R\$ 2.069,64							
1.1.2	105011	SINAPI	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE.AF_03/2024.	M	R\$ 0,46	R\$ 0,56	450,00	R\$ 252,00	100%	450,00	R\$ 252,00					100,00%	450,00	R\$ 252,00							
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 7.477,05																	
1.2.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	51,63	R\$ 62,33	72,00	R\$ 4.487,61	65%	46,80	R\$ 2.916,96	35%	25,20	R\$ 1.570,66	100,00%	72,00	R\$ 4.487,61								
1.2.2	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	103,17	R\$ 124,56	24,00	R\$ 2.989,44	65%	15,60	R\$ 1.943,14	35%	8,40	R\$ 1.046,30	100,00%	24,00	R\$ 2.989,44								
1.3			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 277.406,55																	
1.3.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	R\$ 1,11	R\$ 1,34	2295,00	R\$ 3.075,30	50%	1147,50	R\$ 1.537,65	50%	1147,50	R\$ 1.537,65	100,00%	2295,00	R\$ 3.075,30								
1.3.2	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	R\$ 32,27	R\$ 38,96	900,00	R\$ 35.064,00	50%	450,00	R\$ 17.532,00	50%	450,00	R\$ 17.532,00	100,00%	900,00	R\$ 35.064,00								
1.3.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 8 CM, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM. AF_10/2022	M²	R\$ 75,09	R\$ 90,65	2025,00	R\$ 183.566,25	50%	1012,50	R\$ 91.783,13	50%	1012,50	R\$ 91.783,13	100,00%	2025,00	R\$ 183.566,25								
1.3.4	942274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	R\$ 51,26	R\$ 61,89	900,00	R\$ 55.701,00	50%	450,00	R\$ 27.850,50	50%	450,00	R\$ 27.850,50	100,00%	900,00	R\$ 55.701,00								
1.4			SINALIZAÇÃO					R\$ 2.613,14																	
1.4.1			PLACA OCTOGONAL R-1, EM CHAPA DE AÇO, LADOS COM 25CM, PARE, FIXADA TUBO DE METALON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (2 UNIDADES)					R\$ 1.426,49																	
1.4.1.1	34723	SINAPI-I	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M²	R\$ 771,59	R\$ 931,54	0,60	R\$ 558,86				100%	0,60	R\$ 558,86	100,00%	0,60	R\$ 558,86		R\$ 0,00						
1.4.1.2	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M³	R\$ 116,33	R\$ 140,44	0,13	R\$ 17,70				100%	0,13	R\$ 17,70	100,00%	0,13	R\$ 17,70		R\$ 0,00						
1.4.1.3	92654	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	R\$ 96,51	R\$ 116,52	6,40	R\$ 745,73				100%	6,40	R\$ 745,73	100,00%	6,40	R\$ 745,73		R\$ 0,00						
1.4.1.4	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M³	R\$ 426,77	R\$ 515,24	0,13	R\$ 64,92				100%	0,13	R\$ 64,92	100,00%	0,13	R\$ 64,92		R\$ 0,00						
1.4.1.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	R\$ 244,52	R\$ 295,21	0,13	R\$ 37,20				100%	0,13	R\$ 37,20	100,00%	0,13	R\$ 37,20		R\$ 0,00						
1.4.1.6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 17,21	R\$ 20,77	0,10	R\$ 2,08				100%	0,10	R\$ 2,08	100,00%	0,10	R\$ 2,08		R\$ 0,00						
1.4.2			PLACA A-20a e PLACA A-20b, EM CHAPA DE AÇO, 50CM x 50CM, FIXADA TUBO DE METALON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (2 UNIDADES)					R\$ 1.186,65																	
1.4.2.1	34723	SINAPI-I	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M²	R\$ 771,59	R\$ 931,54	0,39	R\$ 365,63				100%	0,39	R\$ 365,63	100,00%	0,39	R\$ 365,63		R\$ 0,00						
1.4.2.2	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M³	R\$ 116,33	R\$ 140,44	0,13	R\$ 17,70				100%	0,13	R\$ 17,70	100,00%	0,13	R\$ 17,70		R\$ 0,00						
1.4.2.3	92654	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	R\$ 96,51	R\$ 116,52	6,00	R\$ 699,12				100%	6,00	R\$ 699,12	100,00%	6,00	R\$ 699,12		R\$ 0,00						
1.4.2.4	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M³	R\$ 426,77	R\$ 515,24	0,13	R\$ 64,92				100%	0,13	R\$ 64,92	100,00%	0,13	R\$ 64,92		R\$ 0,00						
1.4.2.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	R\$ 244,52	R\$ 295,21	0,13	R\$ 37,20				100%	0,13	R\$ 37,20	100,00%	0,13	R\$ 37,20		R\$ 0,00						

1.4.2.6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 17,21	R\$ 20,77	0,10	R\$ 2,08				100%	0,10	R\$ 2,08	100,00%	0,10	R\$ 2,08		R\$ 0,00
VALOR TOTAL								R\$ 289.818,40	EXECUTADO ACUMULADO ATÉ ESTE BM	R\$ 145.885,01	VALOR DESTA BM	R\$ 143.933,39	EXECUTADO ACUMULADO INCLUSIVE ESTE BM	R\$ 289.818,40	SERVIÇOS A EXECUTAR				

FERVEDOURO / MG, 15 DE AGOSTO DE 2026

Carlos Corindon de Araújo
Prefeito Municipal de Fervedouro

LARISSA FACCHINI
BARBOSA:09644162633

Assinado de forma digital por
LARISSA FACCHINI
BARBOSA:09644162633
Dados: 2026.08.18 15:37:55 -03'00'

Larissa Facchini Barbosa
Engenheira Civil / CREA MG 316.376/D
Responsável Técnico Pela Fiscalização da Obra/Serviço



Documento assinado digitalmente
IRINEU RODES DOS SANTOS
Data: 17/08/2026 15:56:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Crimar Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
Irineu Rodes dos Santos
Sócio Administrador da Empresa



Documento assinado digitalmente
VITOR DA SILVA HUBNER
Data: 15/08/2026 16:01:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vitor da Silva Hubner
Engenheiro Civil RT-Empresa
CREA MG 201.165/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

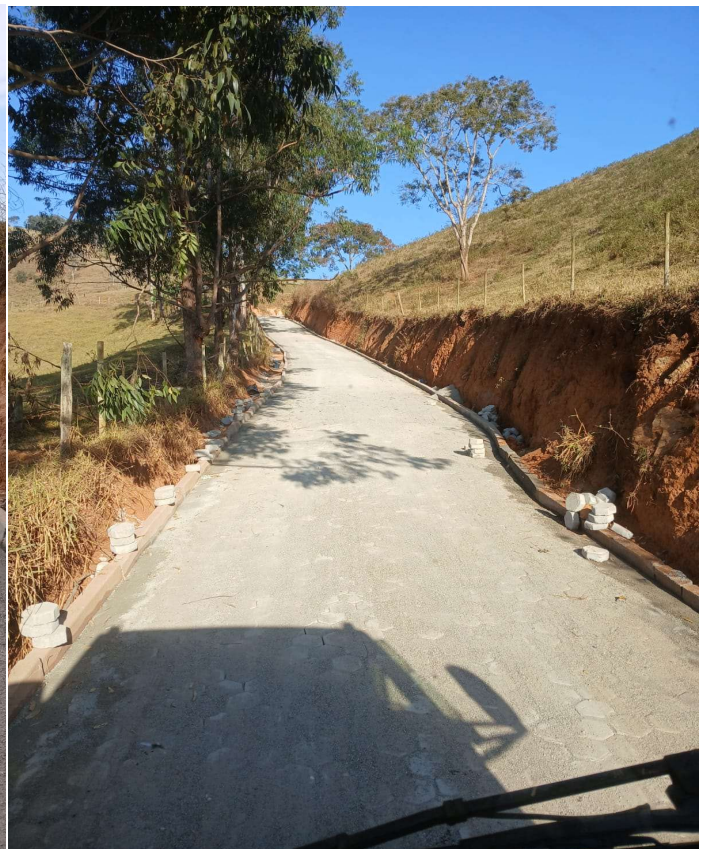



FERVEDOURO / MG, 15 DE AGOSTO DE 2026

CARLOS CORINDON
DE
ARAUJO:49716441649

Assinado de forma
digital por CARLOS
CORINDON DE
ARAUJO:49716441649

Carlos Coríndon de Araújo
Prefeito Municipal de Fervedouro

LARISSA FACCHINI
BARBOSA:09644162633

Assinado de forma digital por LARISSA
FACCHINI BARBOSA:09644162633
Dados: 2026.08.18 15:36:07 -03'00'

Larissa Facchini Barbosa
Engenheira Civil / CREA MG 316.376/D
Responsável Técnico Pela Fiscalização da Obra/Serviço

Documento assinado digitalmente
gov.br IRINEU RODES DOS SANTOS
Data: 17/08/2026 15:56:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Crimar Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP
Irineu Rodes dos Santos
Sócio Administrador da Empresa

Documento assinado digitalmente
gov.br VITOR DA SILVA HUBNER
Data: 15/08/2026 16:01:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vitor da Silva Hubner
Engenheiro Civil RT-Empresa
CREA MG 201.165/D

